ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ						
		7 օր	7 օր	7 օր	7 օր	7 օր	7 օր	7 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ							
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ							
3	Ց/ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂՈՒՄ ՑԱՆՑԻ ՎՐԱ							
4	ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ							
5	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ							
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ							

Դիրք. N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավ.	Քանակը.
1.	Ց/ավազե սվաղի քանդում	մ^2	570.0
2.	Բազալտե սալիկ.իրական. 30 մմ հաստ. 20 գծմ	մ^2	6.0
3.	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ^2	611.0
4.	Շեպերի ց/ավազե սվաղ բարձրորակ	գծմ	490.0
5.	Ցանց Bp d=4.0 մմ , բջիջ 100x100	մ^2/ կգ	611.0/ 1224.8
6.	Խարիսխ Φ 12 ք. 900 մմ շախմատաձև, Լ 300 մմ	կգ/ հատ	20.8/234
7.	Անցքերի շաղափում Φ 20, լցնում պոլիմեր ցեմենտով	հատ	234
8.	Քարե շարվածքի վերականգնում	մ^2	4.0
9.	Տախտակամածի կառուցում	մ^2	851.0
10.	Ներկում ֆասադ. ներկով շեպերի հետ միասին	մ^2	660.0

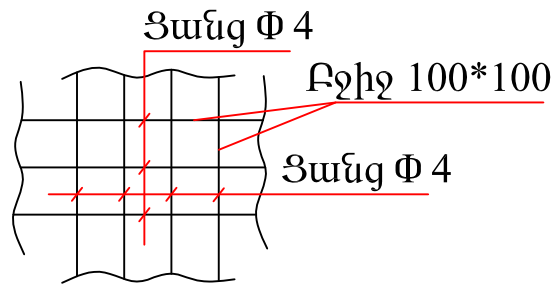

□□.□. □.	□□.□. □.	□□□□□□	□ □ □□.	□□.□□.	□ □□□.□□□	□□ □ □□□□ □ □□□Նաիրի Զարյանի անվան հ. 130 դպրոց ՊՈԱԿ		
						□□ □ □□□ N ՆԱ - 2		
□.□.□.		□. □□□□□□ (□□) □			□□□□ □ □□ □□ □□Նաիրի Զարյանի անվան հ. 130 դպրոցի արտաքին պատի սաղման նախագիծ	□□.□ □	□ □□□□	□ □□□.□□
□□ □ □ □□□□		□. □□□□□□ (□□) □				□□	□□-5	5
					Աշխատանքային ծավալներ, աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց	<<□□□□ե□>> □□□		
