ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՇԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՅՑՄԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ	Խումբը	Աշխատանքների անվանումները	Չ.մ.	Ծավալը	Հիմնավորումը	Աշխատատարություն Նորմա, մ-ժ	Աշխատատարություն Ընդհանուր, մ-հերթ	Բանվորների թիվը	Տևողությունը, օր
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ա	**Նախապատրաստական աշխատանքներ**					72	6	12
		Ժամանակավոր գույքային շինությունների, կոմունիկացիաների տեղադրում, ժամանակավոր ճանապարհների իրականացում, պահեստային և արտադրական տարածքների կարգավորում, մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ:							
	Բ	**Քանդման և հողային աշխատանքներ**							
2		Տանիքի ցինկապատ ալիքավոր թերթերից ծածկույթի քանդում	$մ^2$	460.00	46-04-008-2	0.16	9.20	3	4
3		Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում, խարամի մաքրում	$մ^3$	4.60	E20-1-100	4.1	2.36	2	2
4		Դռների հանում	$մ^2$	40.00	46-04-012-3	1.12	5.60	2	3
5		Պատուհանների հանում	$մ^2$	48.60	46-04-012-1	1.89	11.48	4	3
6		Միջնորմերի քանդում	$մ^3$	12.0	46-8	4.8	7.20	2	4
7		Հատակային ծածկույթների քանդում	$մ^2$	350.00	46-04-009-2	0.4	17.50	4	5
8		Երկաթբետոնե ծածկերի քանդում	$մ^3$	90	46-04-002-2	12.16	136.80	6	24
9		Քարե պատերի քանդում	$մ^3$	250.0	46-04-001-5	6.64	207.50	6	36
10		Այլ քանդման աշխատանքներ					36.00	2	18
11		Փարվածքի մեքենայացված իրականացում՝գրունտի բարձումով ինքնաթափերի վրա՝ներառյալ հարթակների հիմքերի փորվածքները	$մ^3$	200.00	01-01-012	0.05	1.25	1	2
12		Փարվածքի մեքենայացված իրականացում՝կողլիցք	$մ^3$	400.00	01-01-013	0.04	2.00	1	2
13		Բնահողի ձեռքով մշակում	$մ^3$	20.00	01-02-063-4	6.16	15.40	4	4
14		Բնահողի ետլիցք և տոփանում	$մ^3$	420.00	01-01-033	0.076	3.99	2	2
	Գ	**Երկաթբետոնե կառուցվածքներ և շարվածք**							
15		Հիմքերի նախապատրաստական շերտի իրականացում B 7.5 դասի բետոնից	$մ^3$	10.1	06-01-001-1	1.8	2.27	2	1
16		Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B 20 դասի բետոնից	$մ^3$	48.6	06-01-001-22	4.76	28.92	4	7
17		Խարամաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B 10 դասի բետոնից `ներառյալ աստիճանների և հարթակների հիմքերը	$մ^3$	44.3	06-01-001-21	3.71	20.54	2	10
18		Երկաթբետոնե որմնախարսխի իրականացում B 15 դասի բետոնից	$մ^3$	33.4	06-01-024-3	10.51	43.88	4	11
19		Հիմքերի և գետնախարսխի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	$մ^2$	310.0		0.41	15.89	3	5
20		Երկաթբետոնե սյուների և կանգնակների իրականացում	$մ^3$	42.8	06-01-107	14.53	77.68	8	90
21		Երկաթբետոնե հեծանների, գոտիների, բարավորների իրականացում	$մ^3$	104.7	06-01-109-1	16.57	216.94		
22		Երկաթբետոնե ծածկերի իրականացում	$մ^3$	57.4	06-01-110-1	8.4	60.27		
23		Երկաթբետոնե սանդղաբազուկների իրականացում B 20 դասի բետոնից	$մ^3$	3.6	06-01-111-1	24.12	10.70		
24		Երկաթբետոնե պատերի իրականացում	$մ^3$	26.9	06-01-108-8	14.5	48.68		
25		Հատակի երկաթբետոնե սալի իրականացում	$մ^3$	32.0	06-01-001-16	2.48	9.92		
26		Պատերի տուֆե կանոնավոր քարերով շարվածքի իրականացում	$մ^3$	394.0	08-03-002-01	4.43	218.18		
27		Միջնորմերի իրականացում	$մ^3$	40.6	8-140	2.96	15.02		
28		Պատերի և բացվածքների շեպերի երեսպատում տուֆե սալիկներով	$մ^3$	362.7	15-01-002-8	9.49	430.25	6	72
29		Որմնախարսխի և հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով	$մ^3$	131.3	15-01-001-7	8.66	142.13	6	24
30		Մետաղական աստիճանի տեղադրում	$մ^3$	կ-տ	1.00			4	10
	Դ	**Տանիք ATTIC**							
31		Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում (կանգնակ, մարդակ, թեքան, կավարամած)	$մ^3$	16.54	10-02-035-1	15	31.01	3	12
32		Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային և հականեխիչ մշակում, մեկուսացում	$մ^3$	16.54	10-203*	1.6	3.31	2	2
33		Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում	$մ^2$	406.3	12-01-015-01	0.18	9.14	2	4
34		Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում	$մ^3$	97.0	12-01-014-02	3.04	36.86	6	6
35		Տանիքի ծածկույթի իրականացում մետաղակղմինդրից	$մ^2$	607.4	09-04-002-01	0.36	27.33	4	8
36		Հողմնացույցերի տեղադրում	հատ	2.0			0.00	3	2
	Ե	**Բացվածքների լրացում, հատակներ և հարդարում**							
37		Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	$մ^2$	92.2	09-04-009-4	4.74	54.63	4	14
38		Ալյումինե դռների տեղադրում	$մ^2$	20.00	09-04-009-4	4.74	11.85	2	6
39		ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում	$մ^2$	50.31	10-01-041-4	2.38	14.97	3	5
40		Գաջե ծեփի իրականացում	$մ^2$	1 605	15-02-17-1	1.46	292.93	6	48
41		Ցեմենտավազային ծեփի իրականացում	$մ^2$	272.1	15-02-17-1	0.85	28.91	4	7
42		Պատերի սալիկապատում խեցե սալերով	$մ^2$	256.1	15-82	1.7	54.42	4	14
43		Հատակների հարթեցնող շերտի տեղադրում	$մ^2$	632.5	11-01-001-1,2	0.43	34.00	4	9
44		Խեցե սալերից հատակների իրականացում	$մ^2$	68.4	11-01-031-02	2.4	20.52	4	5
45		Մամլագրանիտե հատակների իրականացում	$մ^2$	177.4	11-01-031-02	2.4	53.22	4	14
46		Կախովի առաստաղներ	$մ^2$	72.8	10-04-011	1.86	16.93	4	5
47		Ներկարարական աշխատանքներ	$մ^2$	1 605	15-04-005-2	0.17	34.11	4	9
48		Վինիլային հատակների իրականացում	$մ^2$	371.8	TK58-04	0.5	23.24	4	6
49		Լամինատե հատակների իրականացում	$մ^2$	14.0			0.00	3	2
50		Արտաքին պատերի ցեմենտավազային ծեփի իրականացում՝ներառյալ բացվածքների շեպերը, դեկորատիվ քարերի տեղադրում	$մ^2$	245.4	15-02-005	1.67	51.23	4	13
51		Արտաքին պատերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն ներկով՝ներառյալ բացվածքների շեպերը		245.4	15-04-013	0.14	4.29	2	3
	Զ	**Ինժեներական ցանցեր**							
52		Ջրամատակարարում ,կոյուղի, էլեկտրամատակարարում, ջեռուցում,օդափոխություն					540.00	6	90
53		Արևային մարտկոցների տեղադրում					120.00	4	30
	Է	**Բարեկարգում և կանաչապատում**							
54		Սալվածքներ, հարթակներ, ճանապարհներ, սիզամարգեր, նոր ցանկապատ (157գ.մ.)					600.00	6	100
	Ը	**Կահավորում**			91.0				
		Ընդհանուր					**3932.46**		

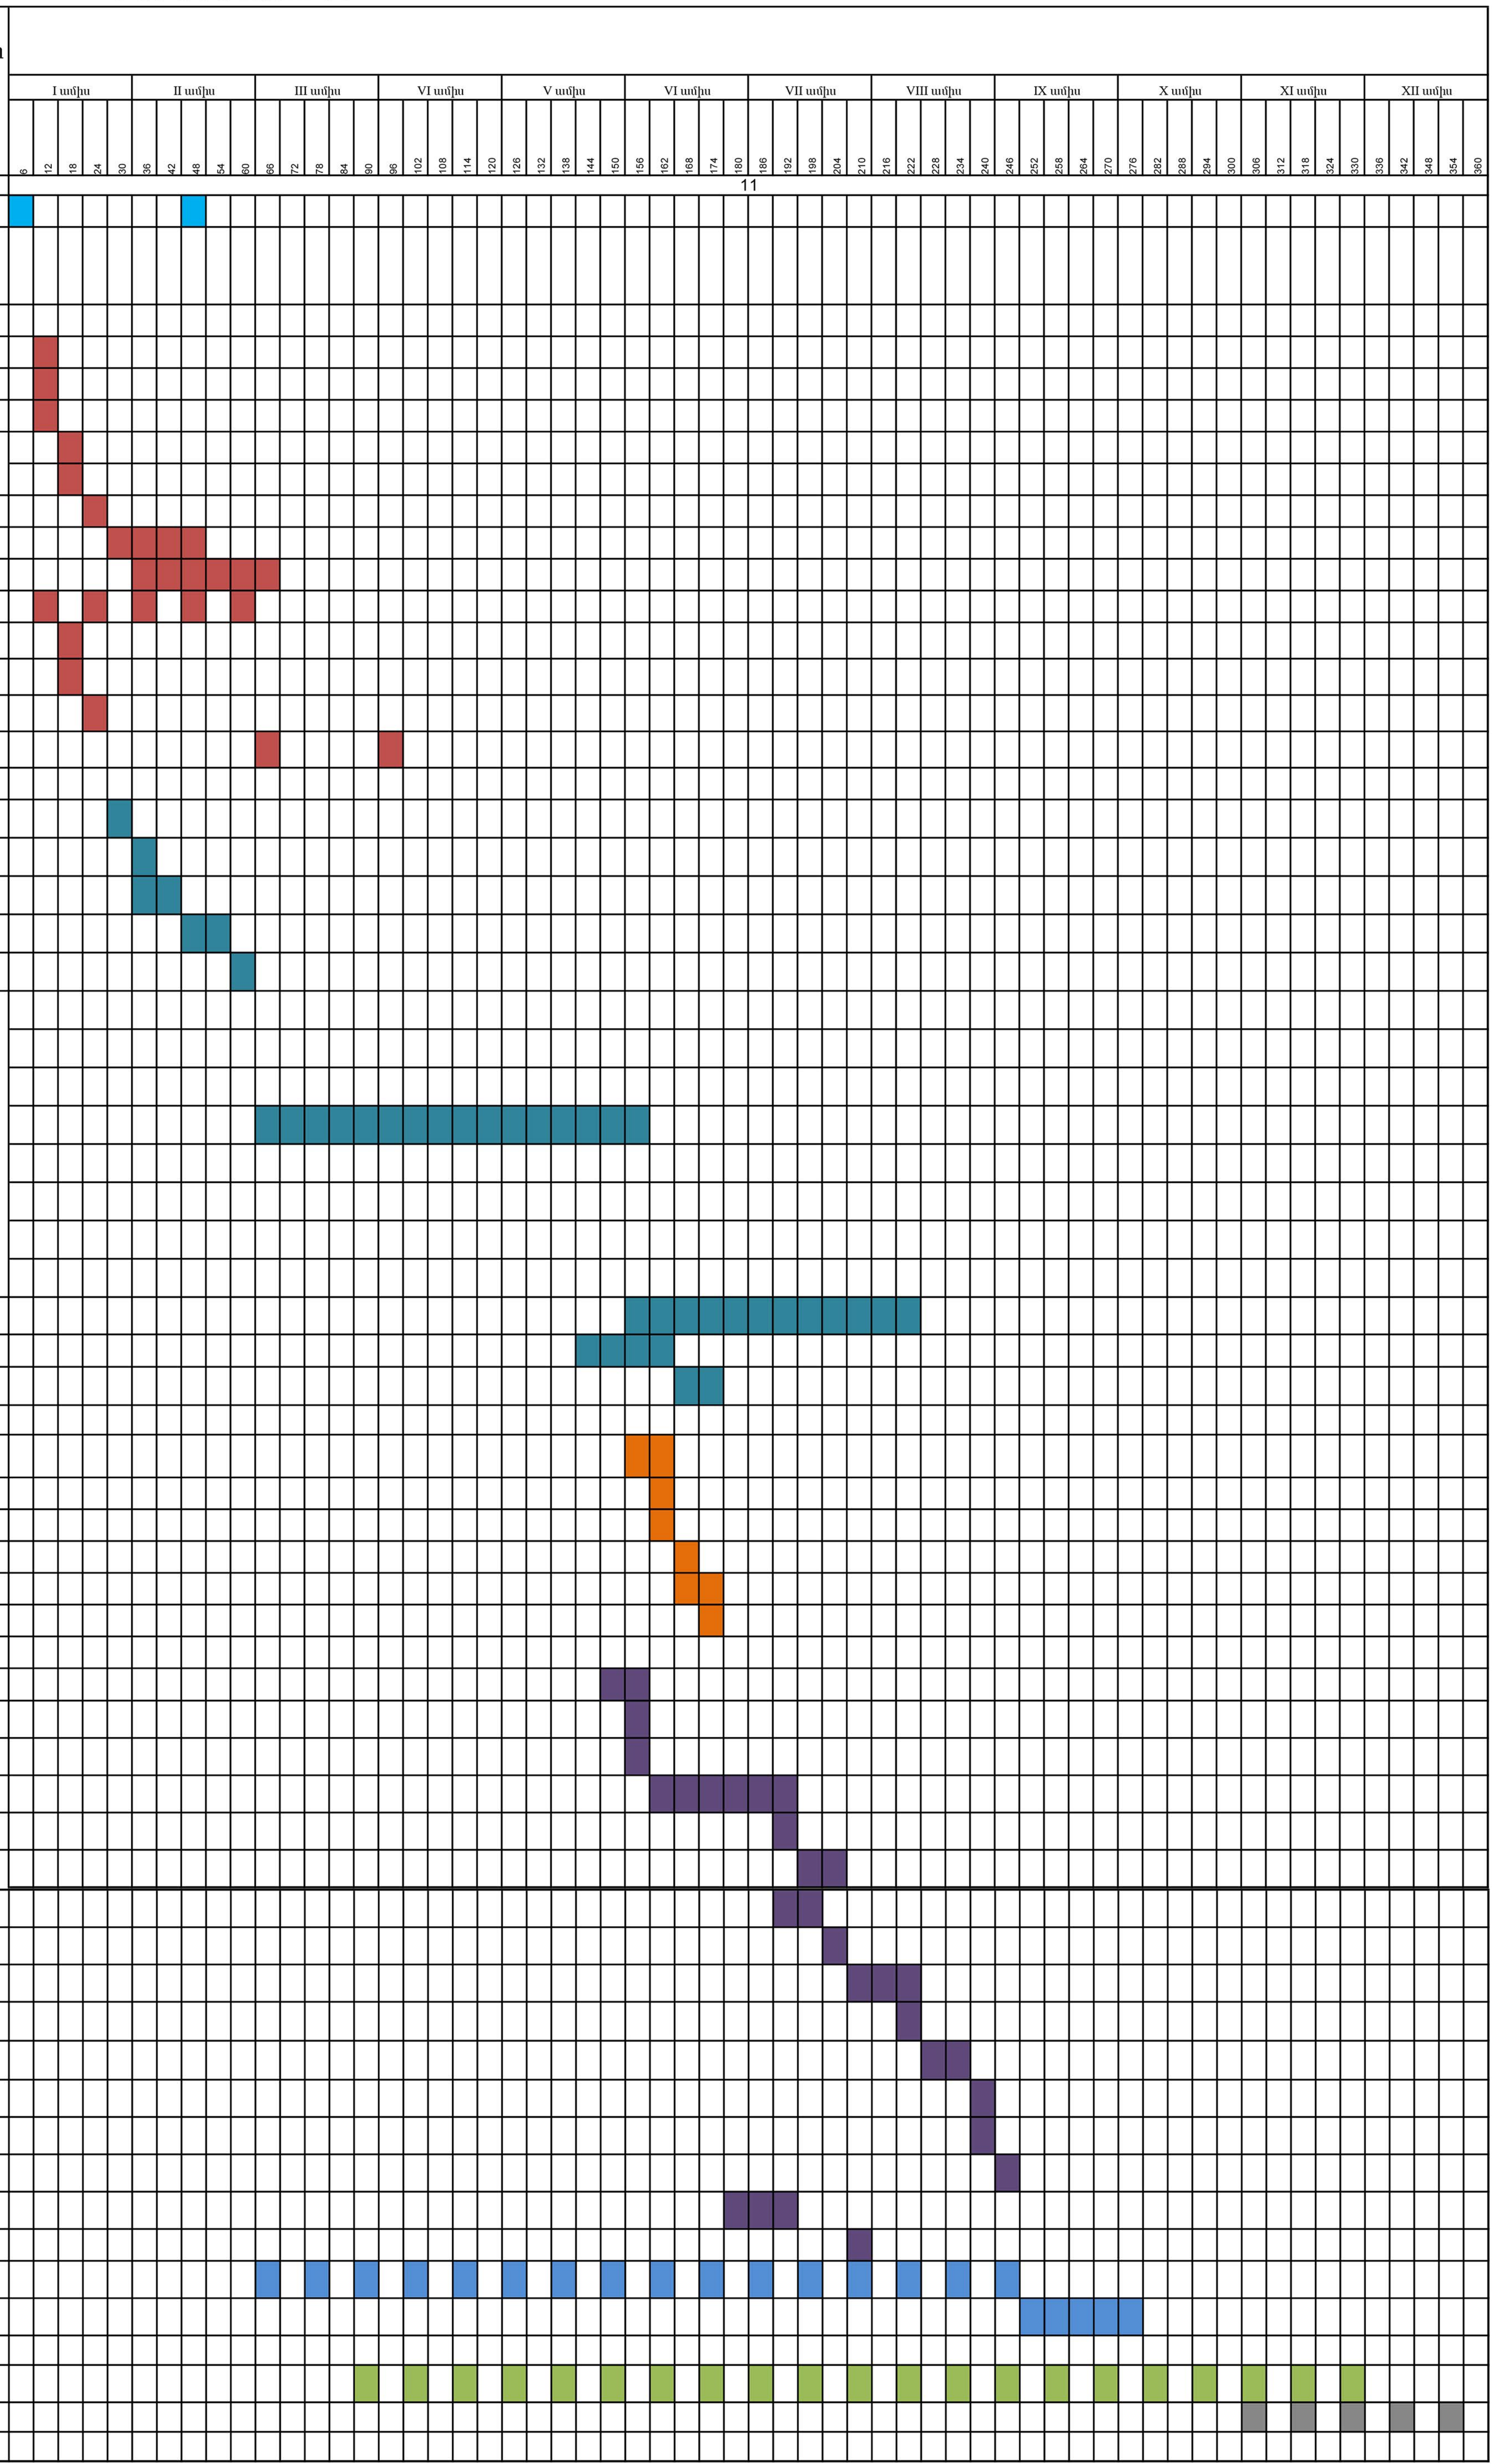

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄԻՍԱԿՅԱՆ		TAR-03 Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում (տեղակապում)
ՆԳՃ	Ա.ՋԱՆՈՒՆՑ		
ԳՃԵՑ	Ա.ՂՈՒԼՅԱՆ		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
			Օրացույցային գրաֆիկ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	ՇԿ-2	2

« ԱՄԱԳ » ՍՊԸ
