ԱՆՎԱՆԱՐԿՈՒՄ

(1) 3 ՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ (ԿԱՐԿԱՍԱ-ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ)

(2) 3 ՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ (----//----//----)

(3) 2 ՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ (----//----//----)

(4) 2 ՀԱՐԿԱՆԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ (----//----//----)

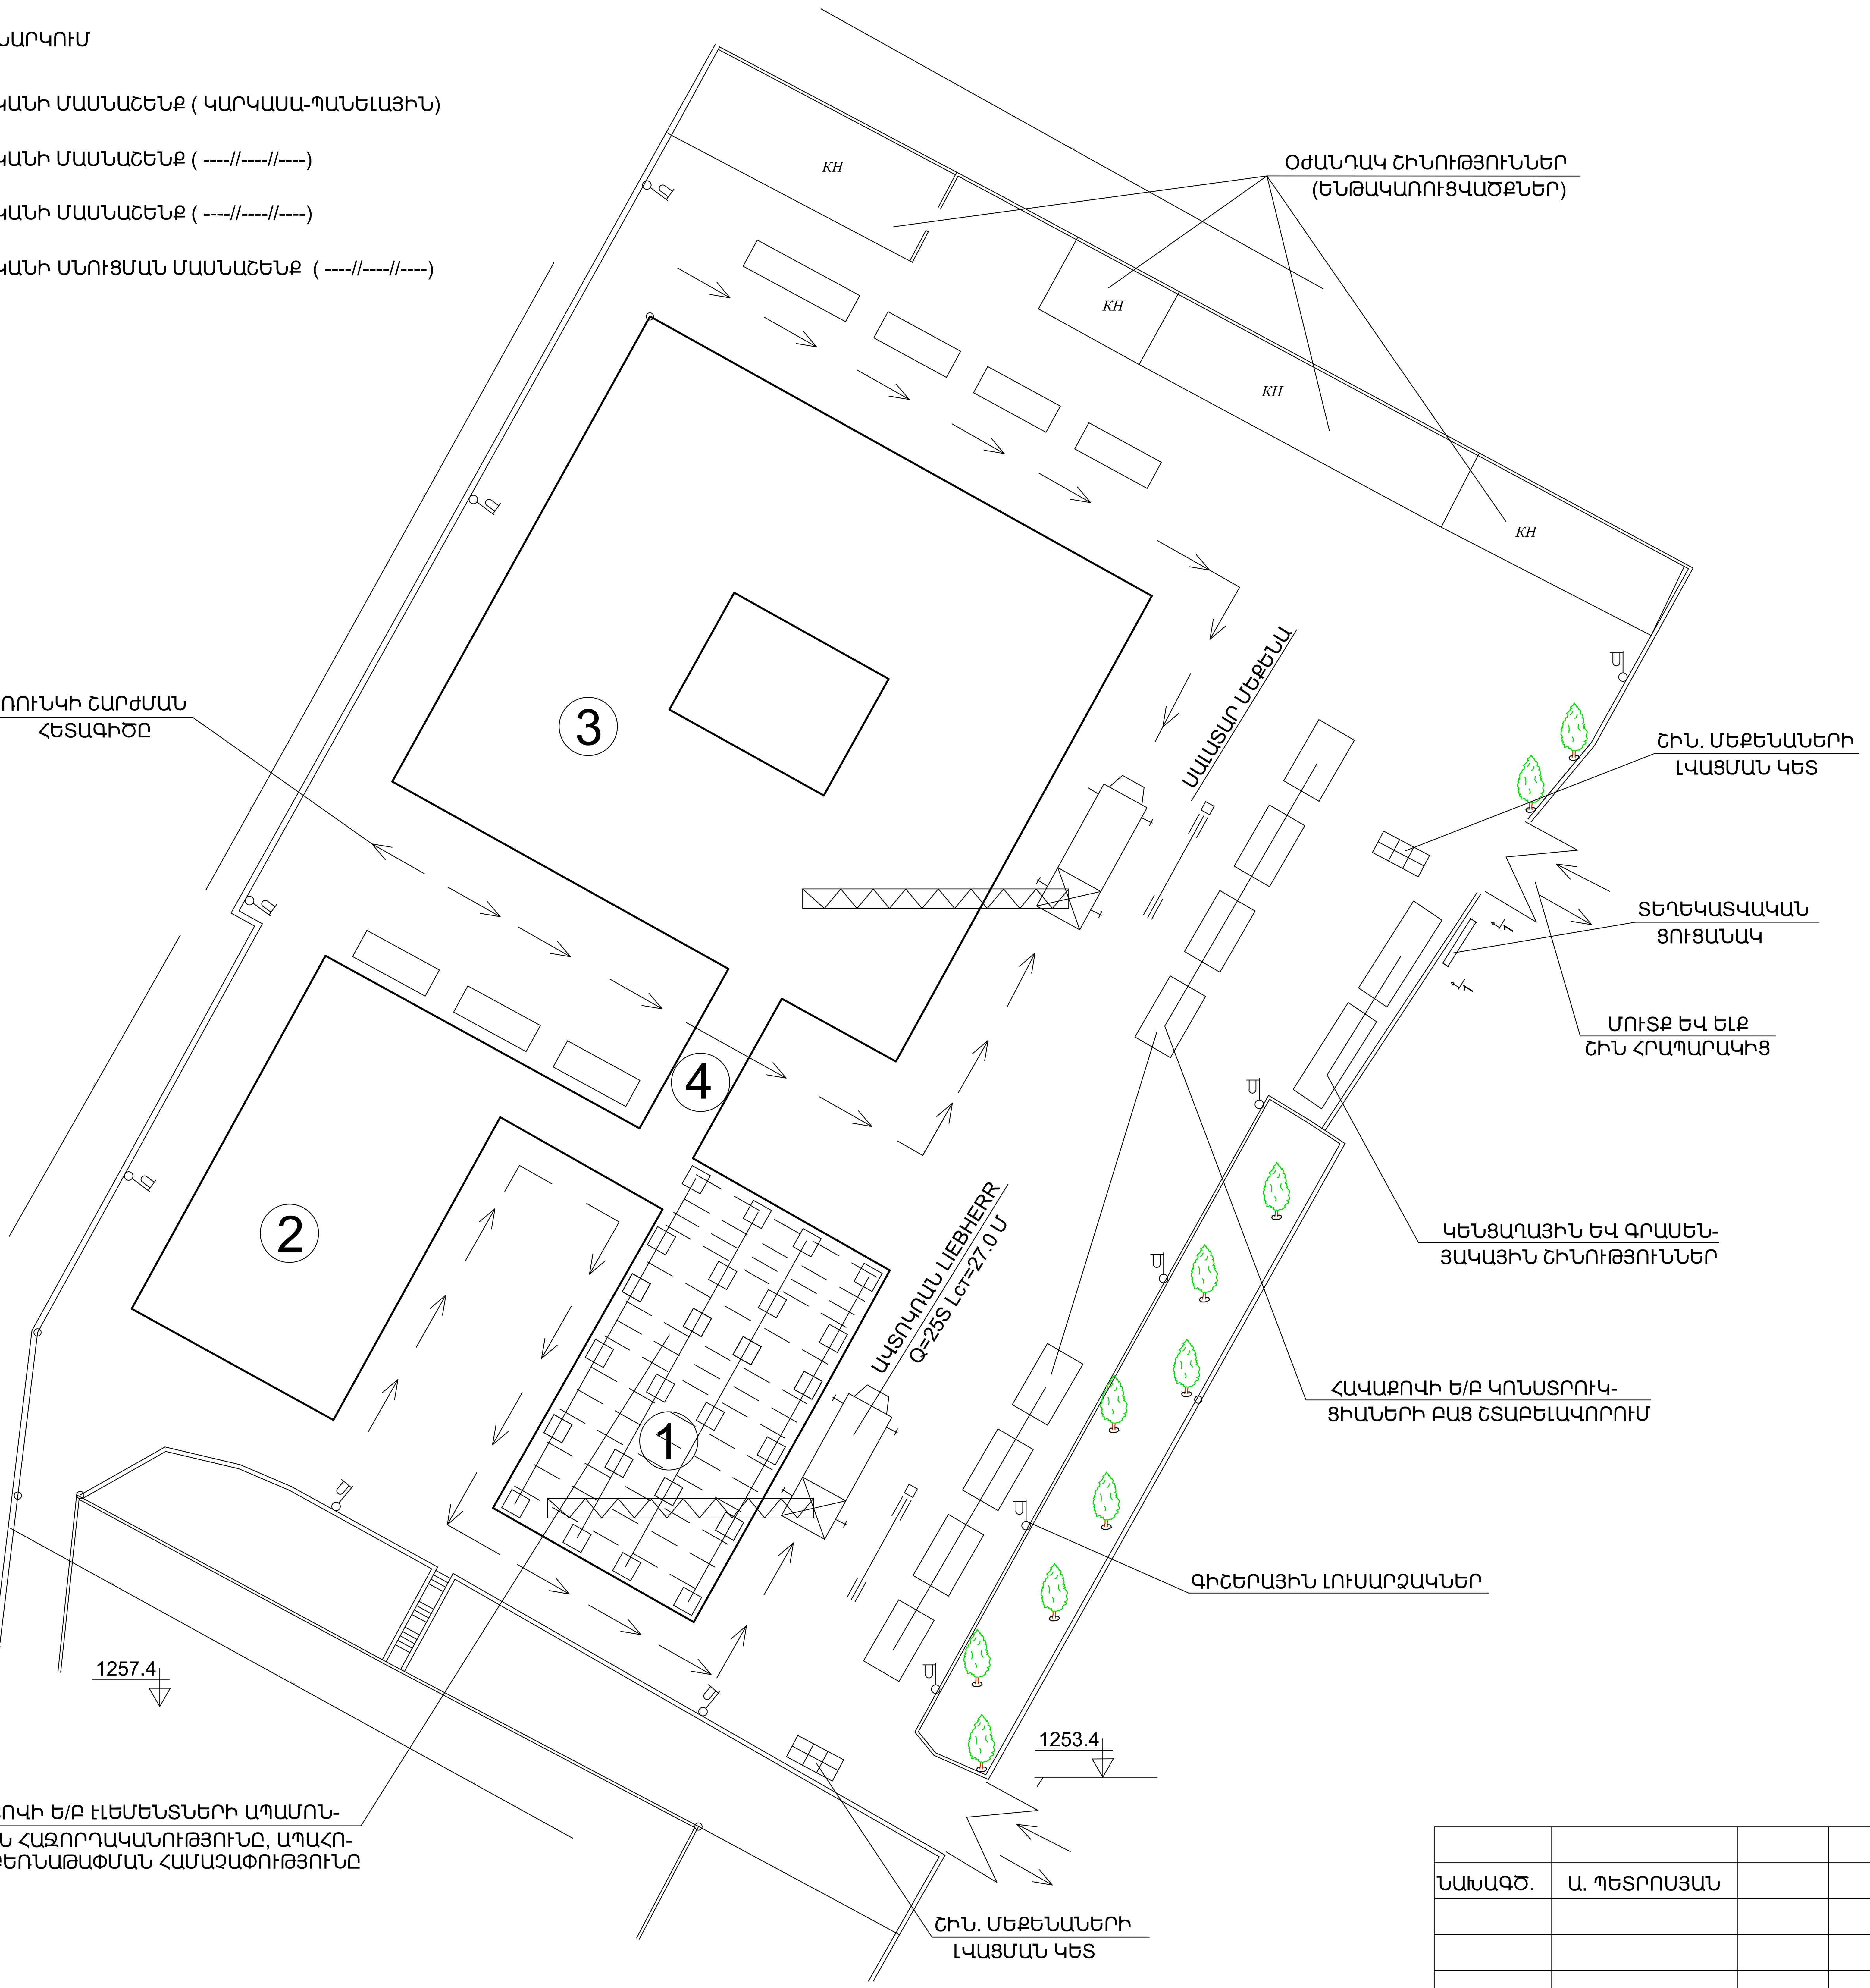

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ ՏԵՍՔ 1-1

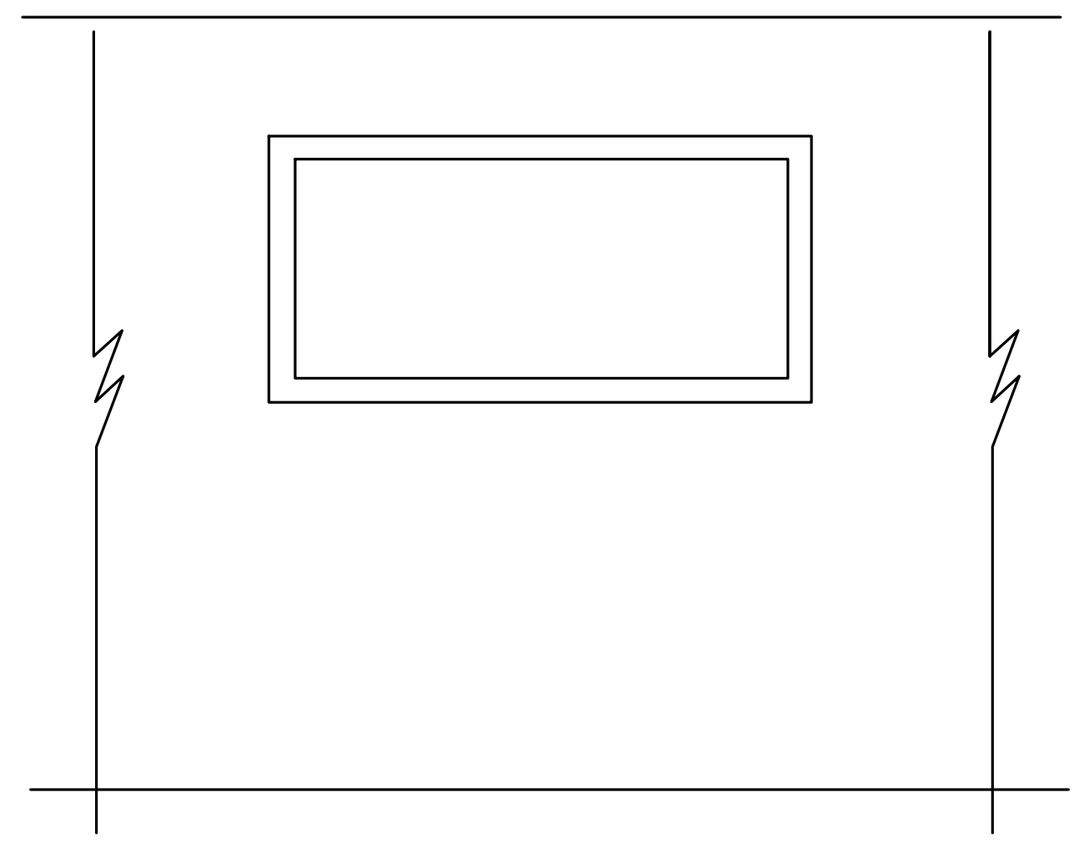

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ԸՍՏ ՇԻՆԳԼԽՀԱՏԱԿԱԳԾԻ

- ՇԻՆ. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱԶՄԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ԱԿՆ)
- ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՇՆԵՎԿ III-IV-2008-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ, ՄՇԱԿԵԼՈՎ ՆԱԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼՈՎ ԱԿՆ-ՈՒՄ, ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ, ԱԶԱՏԵԼՈՎ ԲՈԼՈՐ ԿԱՊԵՐԻՑ, ԲՌՆԻՉՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄՇԱԿԵԼ ՆՈՐ ՀՈՒՍԱԼԻ ԲՌՆԻՉՆԵՐ, ԿԱՊԵԼՈՎ ԱՅՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԻՑ, ՍՏՈՒԳԵԼՈՎ ՁՈՂԵՐԻ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
- ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ
- ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ԸՍՏ ՆՇՎԱԾ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ
- ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱՑՈՒՑ ՀԵՏՈ
- ԱՄԲՈՂՋ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ՏԵՍ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐԸ)

				ԵՐԵՎԱՆ Ք.ԱՎԱՆ Թ.ԾԱՐԱՎ ԱՂԲՅՈՒՐ Փ. N55ա ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ՝ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՊԱՏՎԵՐ N ԵՆ-Ավան ՈՒՍՀ-15/01		
ՆԱԽԱԳԾ.	Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ						
				ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՔԱԿՆ-1	6
				ՇԻՆԳԼԽՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	<<ԵՐԵՎԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՓԲԸ		
