

**ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ 17/26 >>**



ք. Արտաշատ

<<13>> <<հունիս>> 2017 թ.

<<Արտաշատի համայնքապետարան>>-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի Ժ/Պ Իս. Գրիգորյանի, որը գործում է <<կազմակերպության>> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շինակցու>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Տիգրան Նազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Արտաշատ համայնքի Արարատյան թիվ 1, 43 և 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բաղեկադրման և առֆալտընտնդա ծածկի կապիտալ վերանորոգման>> աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են <<օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ <<պայմանագիրը կնքելու պահից սկսած մինչև 30 օրացուցային օր>>:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի

պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախազմանախառնաշփյախն փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագրին օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթեթիս համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինհնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱԾՈՒ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (<ավելված N 4.1), ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում

պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-
ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար
պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Ընդ որում Պատվիրատուն էլեկտրոնային
գնումների համակարգի միջոցով Նապալատին է տրամադրում պատասխանատու
ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝
պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացությունը
և չհաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

2) Նապալատի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված
պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով
նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը
կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թեղությունների վերացման համար պահանջվող
կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Նապալատուն
պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել
անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5
օրյա ժամկետում էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Նապալատին է
ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և
պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից
տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ դրական
եզրակացությունը կամ Աշխատանքը չընդունելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի 4.2-րդ
կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի
ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և
սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային
օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Նապալատին է
տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված
պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով
ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված
աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Նապալատի կողմից շինարարության ակտի մասին տեղեկություն ստանալուց
հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված
հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ակտիվված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման
համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ակտիվված շինարարության
օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց
հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ակտիվված շինարարական
օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի
պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտով, ակտով հանձնագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտով հանձնագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածավետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Նապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Նապալատուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՐԱԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **13119240** (տասներեք միլիոն մեկ հարյուր տասնինը հազար երկու հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 2186540 (երկու միլիոն մեկ հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.2 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ **11166563** ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող 6 ամիսներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Նապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Նապալատուն կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացույցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Նապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա

¹ Սույն վերջը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25 դեկտեմբեր 2017 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VFS = VF / (1 + x \cdot DF)$, որտեղ՝

VF -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է².

$1 + x$ -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DF -ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

x -ը S - ծավալաթեթեւ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառում պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (Ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂՔԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՓԻ ԱՋԻԵՑԻՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հողհեղ, պատերազմը, ռազմական և

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա VF -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժինի գինն է:

³ Պայմանագրին օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված միևեր դեպքում քուզանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար պրիկալ ցնթացում կիսակազմված ֆինանսական միջոցներ և կվեքսի համաձայնագիր:

արտակարգ դրություն հայտարարել, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհադին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, հապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կիանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով հապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) հապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում հապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշվված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁴:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁵:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխարարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխարարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Հապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է հապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Հապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում հապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է հապալառուն:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

⁴ Սույն կետից հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալառուի կնքելու միջոցով:

⁵ Սույն կետից հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարժեք գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հաղելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ՝ 04201153

Հ/Հ՝ 900412151509

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շինպլուս>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/3


ՀՎՀՀ՝ 00891777

Հ/Հ՝ 220553330550000

<<Ալբա Կրեդիտ Ագրիկուլթանկ>> ՓԲԸ



Համաձայնագրի պայմանագրի դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը

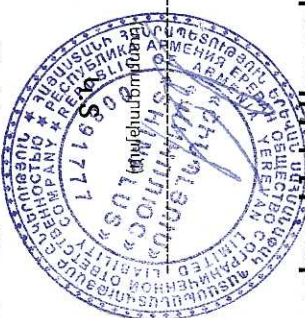

Հավելված թիվ 1
 <<13>> հունիս 2017 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԱՄԱՀ-ԳՀԱՇԸԲ 17/26 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{6*}

**<<ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՐՏՅԱՆ ԹԻՎ 1, 43 ԵՎ 44 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ
 ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԱՄՖԱՆՏԵՏՈՆՅԱՆ ԾԱԾԿԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ >>
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Տ/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Արարատյան թիվ 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի բարեկարգում և ասֆալտրենտոյա ծածկի կապիտալ վերանորոգում	0.00	0.00	0.00	0.00
	Եղթնեկելի մաս	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Գոյություն ունեցող կոպճաավազային շերտի քանդում 12սմ.հաստ. 785մ²	Մ³	94,200	0.58	54.50
2	Շին աղբի բարձր ա/րնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	Տն	150.00	2.43	364,64
3	Գոյություն ունեցող ղիտահորերի			0.00	0.00

⁶ Ծավալաթերթ-նախաշիվը որպեսզանվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

	Բարձրացում				
4	Առկան դիտահողերի կափարիչների ապամոնտաժում	Հատ	5.000	4.15	20,73
5	Առկա դիտահողերի վրա լրացուցիչ հիմնագրում պատրաստում B-15 դասի Բետոնից /Բարձրացման համար/	Մ³	0,600	60.96	36,57
6	Դիտահողերի կափարիչի վերամոնտաժում	հատ	5.000	13.40	66,98
7	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 8 սմ հաստությամբ	Մ²	785,00	1.05	823,04
8	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	Մ²	785,00	4.18	3282,63

ընդամենը 4649090
 11% 511399,9
 ընդամենը 5160489,9
 20% 1032097,9
 Ընդամենը 6192587

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Ն/մ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը Հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
	Արարատյան թիվ 43 և 44 բազմանկյարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգման և ասֆալտբետոնյա ծածկի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների	0.00	0.00	0.00	0.00
	Երթնեկելի մաս	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Գոյություն ունեցող կույճապակալային շերտի քանդում 12սմ.հաստ. 1200մ²	Մ³	144.000	0.58	83.31
2	Շին աղբի բարձում ա/իւքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	Տն	230,00	2.43	559.11
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի բարձրացում			0.00	0.00
4	Առկան դիտահորերի կափարիչների ապահովում	Հատ	12,000	4.15	49.74
5	Առկա դիտահորերի վրա լրացուցիչ հիմնագրում	Մ³	1.440	60.96	87.78

	սատրաստում B-15 դասի բետոնից /բարձրացման համար/				
6	Դիտահորերի կափարիչի վերանոնսածում	հատ	12.000	13.40	160.75
7	Երթնեկեկի մասի խճի շերտի սատրաստում 8 սմ հաստությամբ	Մ²	1200.00	1.05	1258.15
8	Երթնեկեկի մասի մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի սատրաստում 4սմ հաստությամբ	Մ²	1200.00	4.18	5018.03
9	Մայթ			0.00	0.00
	Գոյություն ունեցող հին խճահողային շերտի քանդում 10սմ հաստությամբ /210սմ²/	Մ³	20.000	0.54	10.75
10	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	Տն	28.00	2.43	68.07
11	Նոր կույճավազային շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ 200սմ²	Մ³	16.000	3.10	49.63
12	Մայթի մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի	Մ²	200.000	3.41	682.41

պատրաստում հաստությամբ	Յսմ			
13	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում Բետոնե հիմքով 15x30սմ	Գմ	70.000	6.62
				463.16
Ընդամենը 8490890 11% 933997 Ընդամենը 9424887 20% 1884977 Ընդամենը 11309864				

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Արտաշատ Արարատյան թիվ 1, 43 և 44 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ՝ 04201153

Հ/Հ՝ 900412151509

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<Շինպյուս>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/3

ՀՎՀՀ՝ 00891777

Հ/Հ՝ 220553330550000

<<Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ

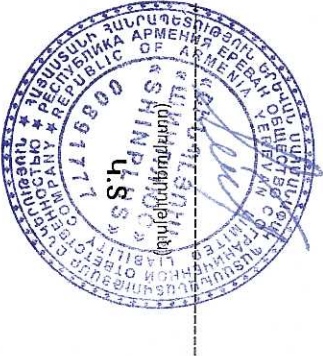


Հավելված թիվ 2
<<13>> հունիս 2017 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ասու<-ԳՀԱՇԲ 17/26 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
<< ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՐՏԱՆ ԹԻՎ 1, 43 ԵՎ 44 ԲԱԶՄԱՔԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԵԿԱՐԳԱՄԱՆ ԵՎ ՍԱՖԱՆՏԵՏՈՒՑԱ ԾԱԾԿԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ >>
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	4 օրացույցային օր
2	Գոյություն ունեցող դիտահորերի՝ բարձրացման, կափարիչների ապամոնտաժման, վերամոնտաժման, դիտահորերի վրա լրացուցիչ հիմնագրատում պատրաստում B-15 դասի բետոնից /բարձրացման համար/	5-րդ օրացույցային օրվանից հաշված	10 -րդ օրացույցային օր
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x30սմ	11-րդ օրացույցային օրվանից հաշված	17-րդ օրացույցային օր
4	Խճի շերտի պատրաստում	18 -րդ օրացույցային օրվանից հաշված	22-րդ օրացույցային օր
5	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն ծածկույթի պատրաստում:	23-րդ օրացույցային օրվանից հաշված	30-րդ օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված	30 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Արտաշատի համայնքապետարան
Ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04201153
Հ/Հ 900412151509

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Շինվարու>> ՍՊԸ
Ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/3
ՀՎՀՀ՝ 00891777
Հ/Հ՝ 22055330550000
<<Ակբա Կրեդիթ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ

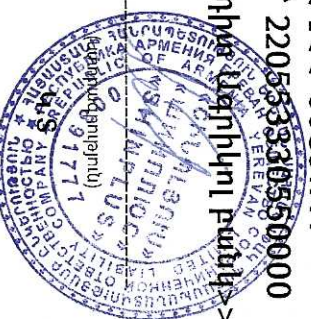

Հավելված թիվ 3
<<13>> հունիս 2017 թ.
կնքված աշխատանքների կադրային
թիվ << ԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ 17/26 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՐՏՅԱՆ ԹԻՎ 1, 43 ԵՎ 44 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐ ԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԱՄՖԱՆՏԵՏՈՆՅ Ա ՇԱԾԿԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱ Ն ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ	---	---	---	---	11166563	11166563	11166563	11166563	11166563	11166563	11166563	11166563	11166563

*վճարման եղանակ գումարները ներկայացված են անողական կարգով


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ՝ 04201153
Հ/Հ՝ 900412151509



ՀՀ ՑԻԲ Գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Շինպլուս>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/3
ՀՎՀՀ՝ 00891777
Հ/Հ՝ 220553330550000
<<Ակբա Կրեդիտ Ագենտություն ՓԲԸ



կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<Պայմանագրի ծածկագիրը>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հի _____

հվի _____

գտնվելու վայրը _____

հի _____

հվի _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և _____

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված գնման հայտը

նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև

նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական

բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների						
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համադրու շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
			ըստ	վրաս	փաստացի	վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			պայմանագրով հաստատված գնման	պայմանագրով հաստատված գնման	փաստացի	ժաման տը /ըստ վճարմ ան ժաման ակացու յցի/

վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
-----ի (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. -----ի ն կնքված N -----
(Կապալատուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. ----- --ի ն հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն
